

Comune di TRADATE
Provincia di VA

DIAGRAMMA DI GANTT

cronoprogramma dei lavori

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

OGGETTO: MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1) CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA).
(Particella catastale 3755 subalterno n.8 - foglio 16)

COMMITTENTE: COMUNE DI TRADATE.

CANTIERE: VIA ISONZO, TRADATE (VA)

10/02/2021

IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA

(DA DEFINIRE)

studio tecnico geom. Giovanni Polli

MESSA IN SICUREZZA COPERTURA IMMOBILE DI PROPRIETA' COMUNALE (EX MAGAZZINI di VIA ISONZO N.1) CON RIMOZIONE DI COPERTURA IN CEMENTO AMIANTO E REALIZZAZIONE DI NUOVA COPERTURA VIA ISONZO n.1 - TRADATE (VA).

TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
Recinzione e apprestamenti del cantiere					
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	E	2	2	02/11/2021	03/11/2021
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	E	2	2	02/11/2021	03/11/2021
Montaggio del ponteggio metallico fisso e dei parapetti in copertura	E	6	8	02/11/2021	09/11/2021
Montaggio delle reti di sicurezza interne anticaduta	E	4	4	09/11/2021	12/11/2021
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	E	1	1	03/11/2021	03/11/2021
Impianti di servizio del cantiere					
Realizzazione di impianto elettrico e di messa a terra del cantiere	E	1	1	10/11/2021	10/11/2021
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	E	1	1	10/11/2021	10/11/2021
Rimozione di lattoneria di vario genere					
Rimozione di scossaline e canali di gronda e pluviali	E	2	2	25/11/2021	26/11/2021
Smobilizzo del cantiere					
Smontaggio del ponteggio metallico fisso, dei parapetti in copertura e delle reti	E	3	3	24/01/2022	26/01/2022
Smobilizzo del cantiere	E	2	2	27/01/2022	28/01/2022
Movimentazione materiali					
Movimentazione di materiali in cantiere con mezzi vari	E	59	85	04/11/2021	27/01/2022
Confinamento e incapsulamento amianto					
Incapsulamento di coperture in cemento amianto	E	3	3	15/11/2021	17/11/2021
Rimozione di manufatti contenenti amianto					
Rimozione di coperture in cemento amianto	E	19	28	17/11/2021	14/12/2021
Rimozione di coibentazioni varie sottomanto	E	19	28	17/11/2021	14/12/2021
Rimozione di piccola orditura lignea	E	19	28	17/11/2021	14/12/2021
Manti di copertura					
Realizzazione di piccola orditura in legno	E	19	26	22/11/2021	17/12/2021
Montaggio di rete metallica su nastri di luce esistenti	E	16	23	22/11/2021	14/12/2021
Montaggio di copertura in lamiera grecata e opere accessorie	E	19	26	22/11/2021	17/12/2021
Opere di lattoneria					
Montaggio di scossaline e canali di gronda	E	7	9	23/12/2021	31/12/2021
Montaggio di pluviali e camini	E	7	9	23/12/2021	31/12/2021
Sistemi anticaduta					
Installazione sistemi di ancoraggio in copertura	E	4	5	03/01/2022	07/01/2022
Completamento impianti d'illuminazione interni					
Installazione di corpi illuminanti e opere connesse	E	10	12	10/01/2022	21/01/2022


LEGENDA:

I = IMPRESA

Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro
gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

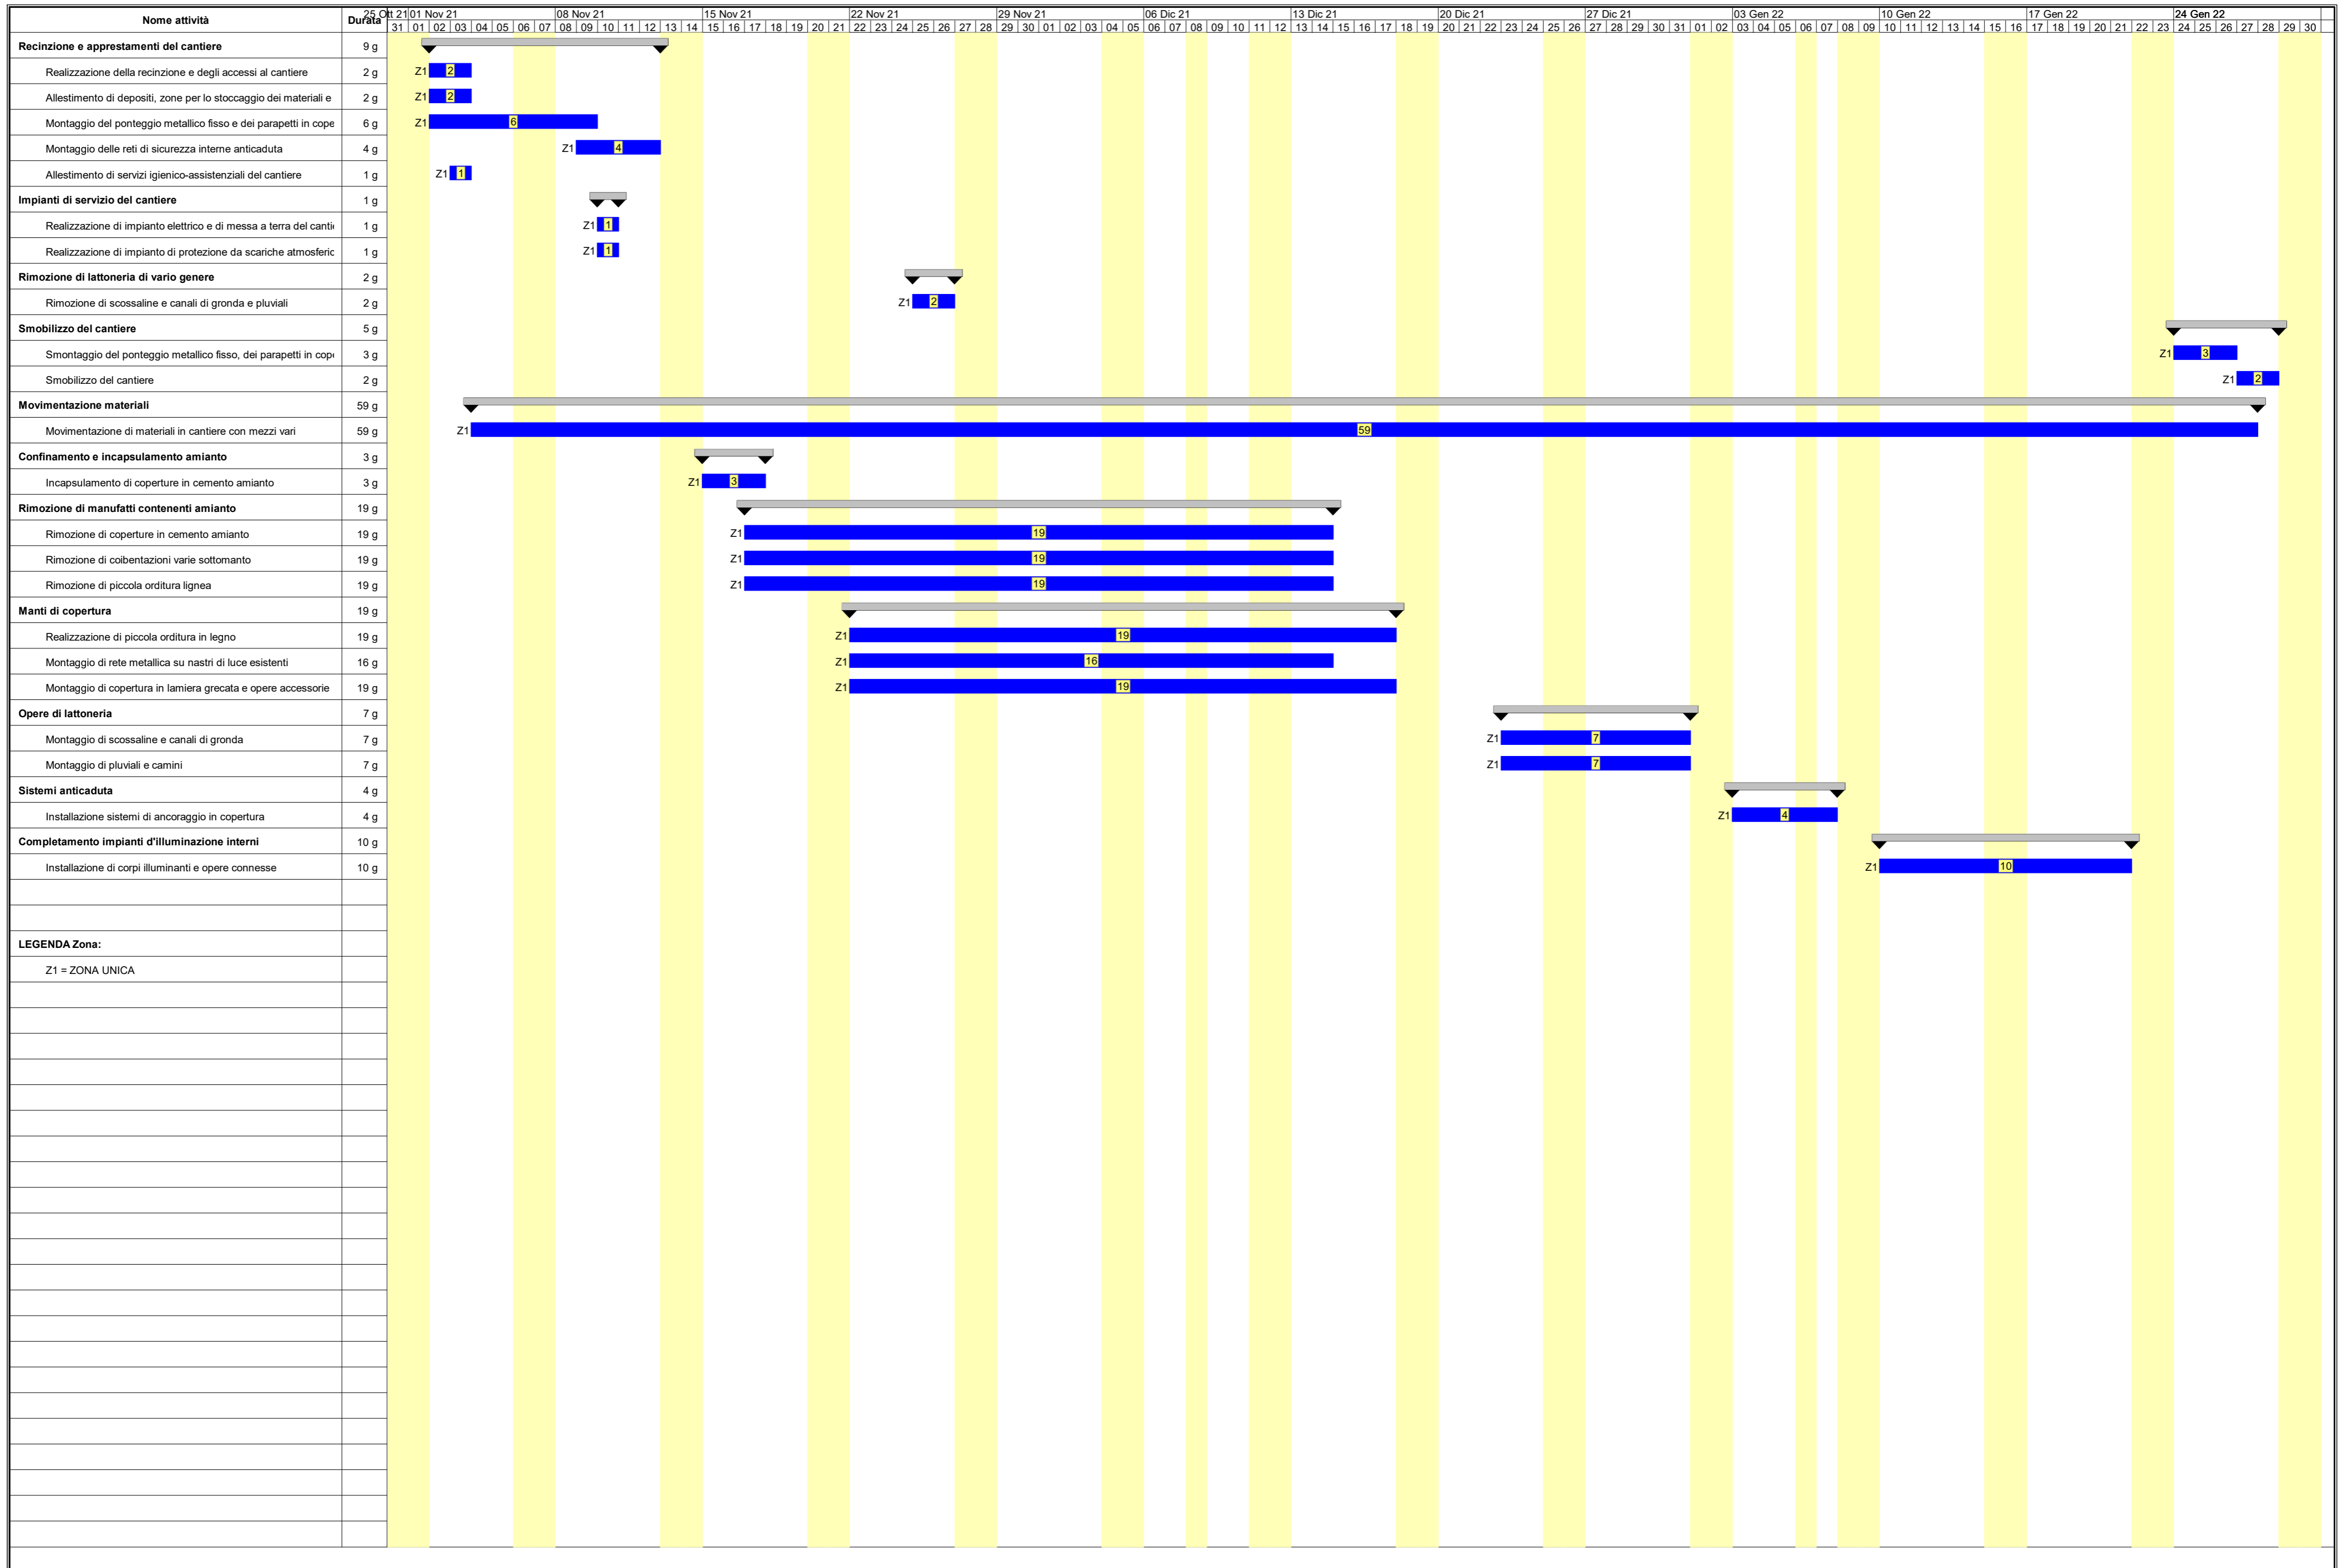

LEGENDA Zona:
Z1 = ZONA UNICA
